

白岡駅東部中央土地区画整理事業年度別歳出等一覧表


(単位：千円)

区 分	事業開始年度から (平成8年度) 令和3年度までの累計額 A	$\frac{A}{F}$	令和4年度 決 算 額 B	$\frac{A+B}{F}$	令和5年度 決算見込額 C	$\frac{A+B+C}{F}$	令和6年度 当初予算額 D	$\frac{A+B+C+D}{F}$	令和7年度 以降の見込額 E	合 計 F
1 市 費	4,605,239	—	176,507	—	190,188	—	194,611	—	1,253,474	6,420,019
(うち起債額)	( 0 )		( 0 )		( 0 )		( 0 )		( 0 )	( 0 )
2 国・県補助金	830,527	—	89,393	—	41,306	—	59,650	—	745,983	1,766,859
3 その他	1,105,099	—	559	—	23,268	—	40,930	—	243,266	1,413,122
(分担金及び負担金)	( 641,000 )		( 543 )		( 17,849 )		( 0 )		( 0 )	( 659,392 )
(保留地処分金)	( 463,601 )		( 0 )		( 5,399 )		( 40,920 )		( 243,080 )	( 753,000 )
(諸収入)	( 498 )		( 16 )		( 20 )		( 10 )		( 186 )	( 730 )
計	6,540,865	68.1%	266,459	70.9%	254,762	73.6%	295,191	76.6%	2,242,723	9,600,000

備 考 この表は、事業計画に定める資金計画を基に作成したものであり、今後の残事業費の変更に伴い、未執行金額に増減が生じる場合があります。

# 白岡駅東部中央土地区画整理事業進捗状況図

平成十二年三月作成

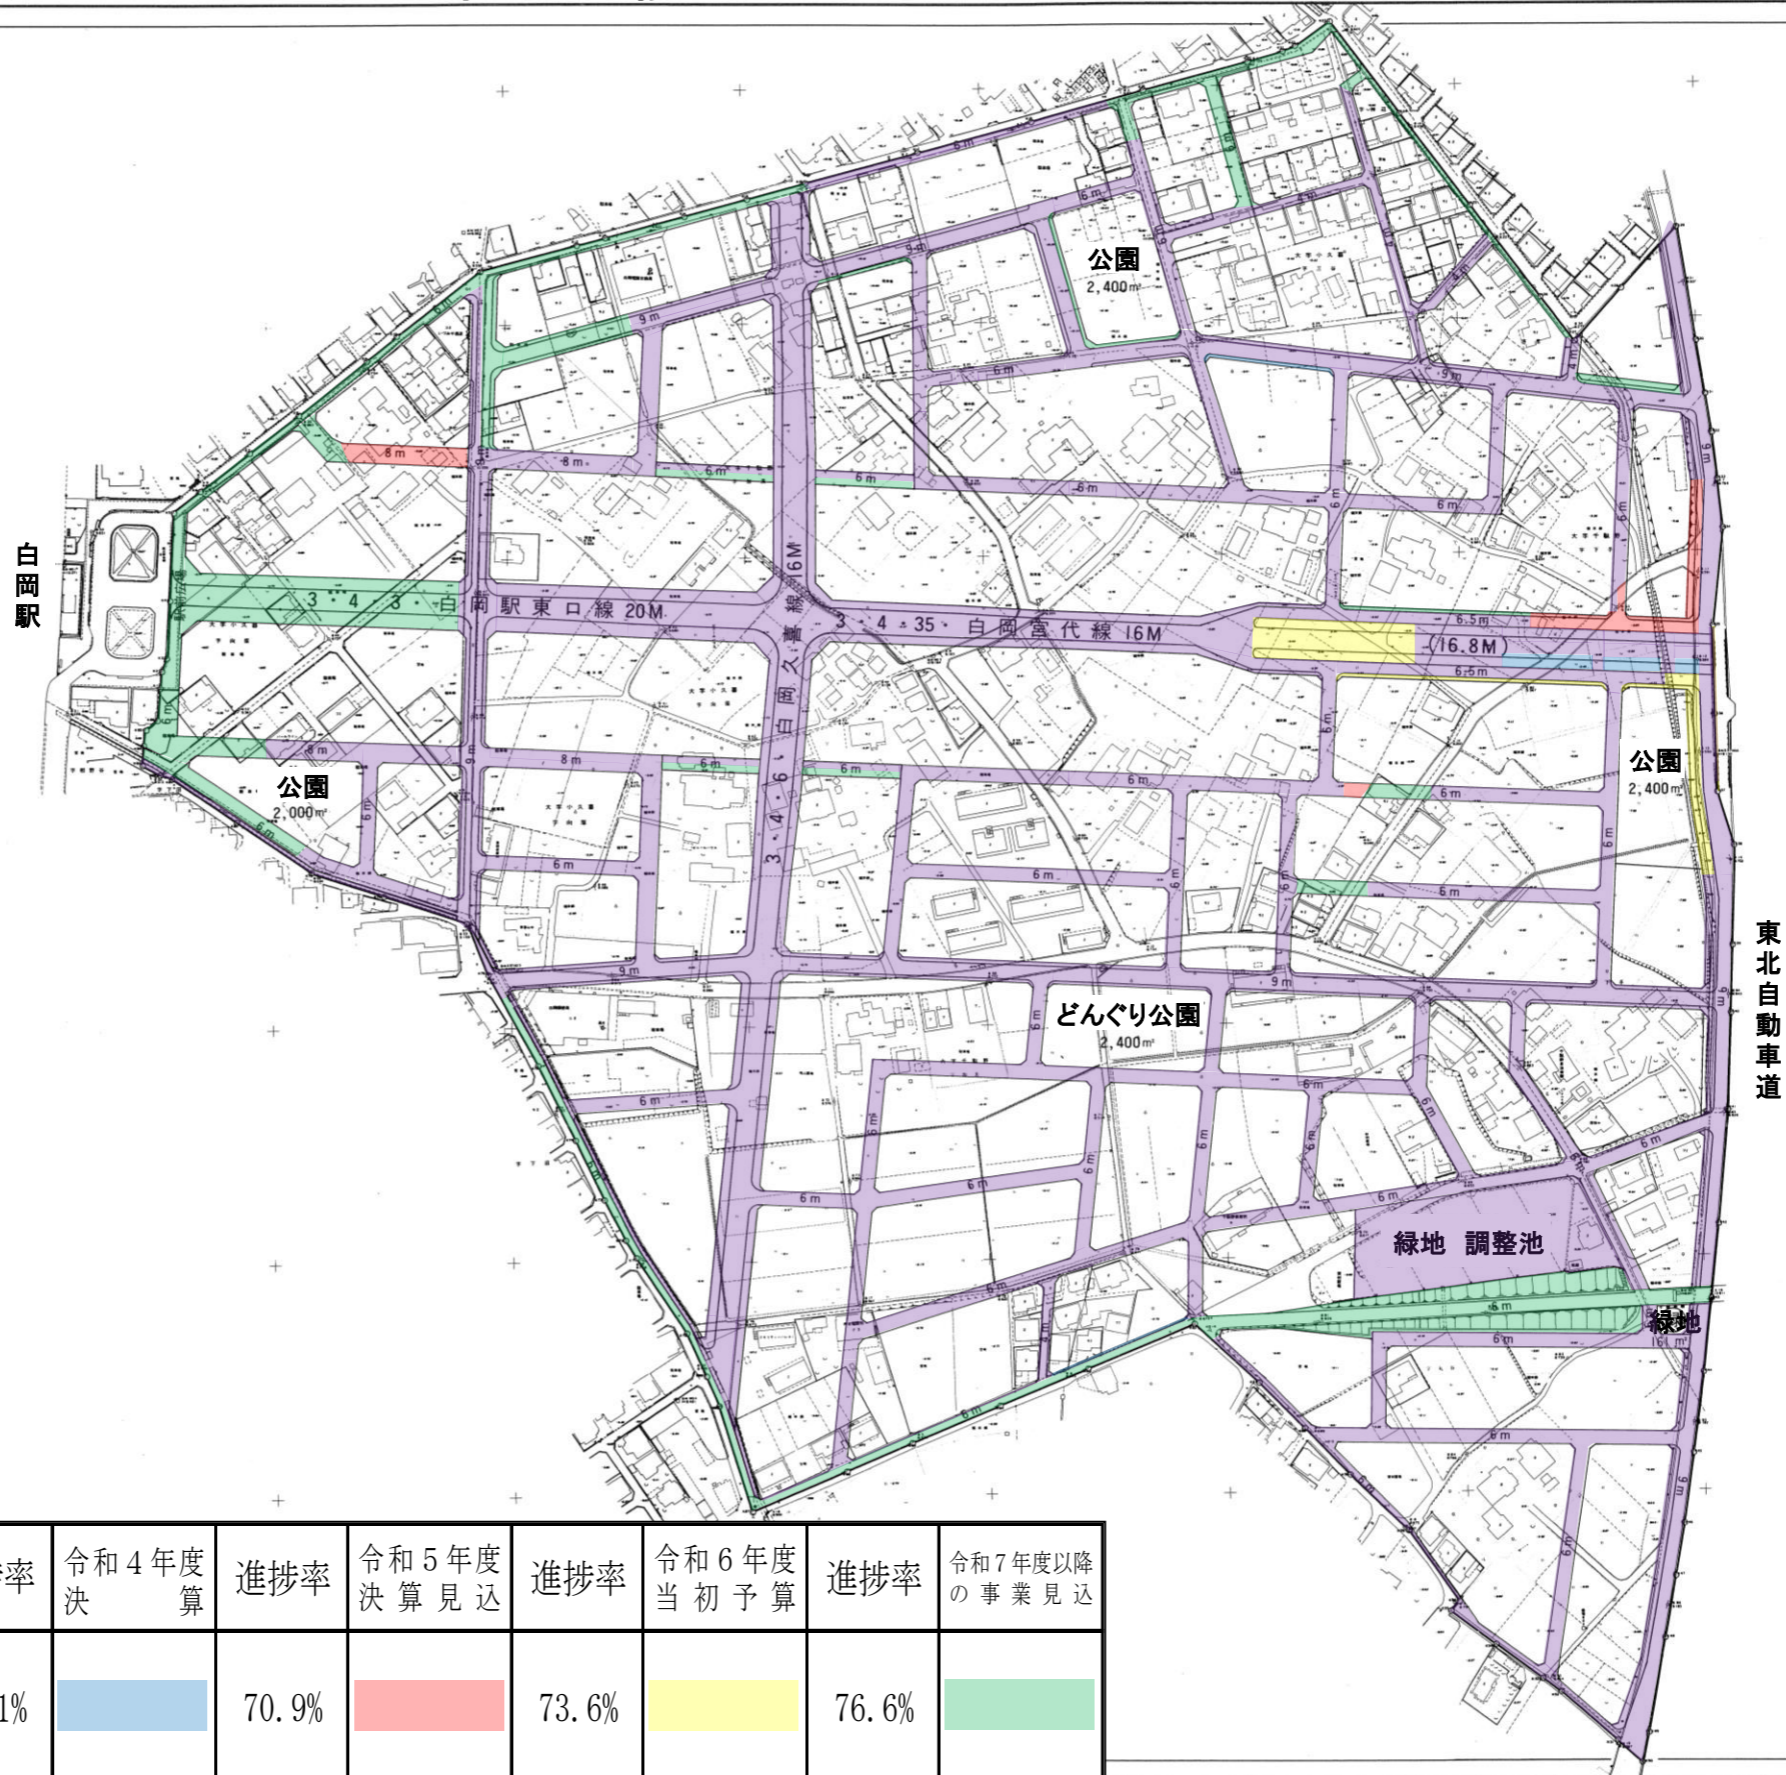


区分	事業開始年度から (平成8年度) 令和3年度までの累計	進捗率	令和4年度 決算	進捗率	令和5年度 決算見込	進捗率	令和6年度 当初予算	進捗率	令和7年度以降 の事業見込
		68.1%		70.9%		73.6%		76.6%	

白岡駅東部中央土地区画整理事務所

# 白岡駅東部中央土地区画整理事業使用収益開始状況図

平成十二年三月作成

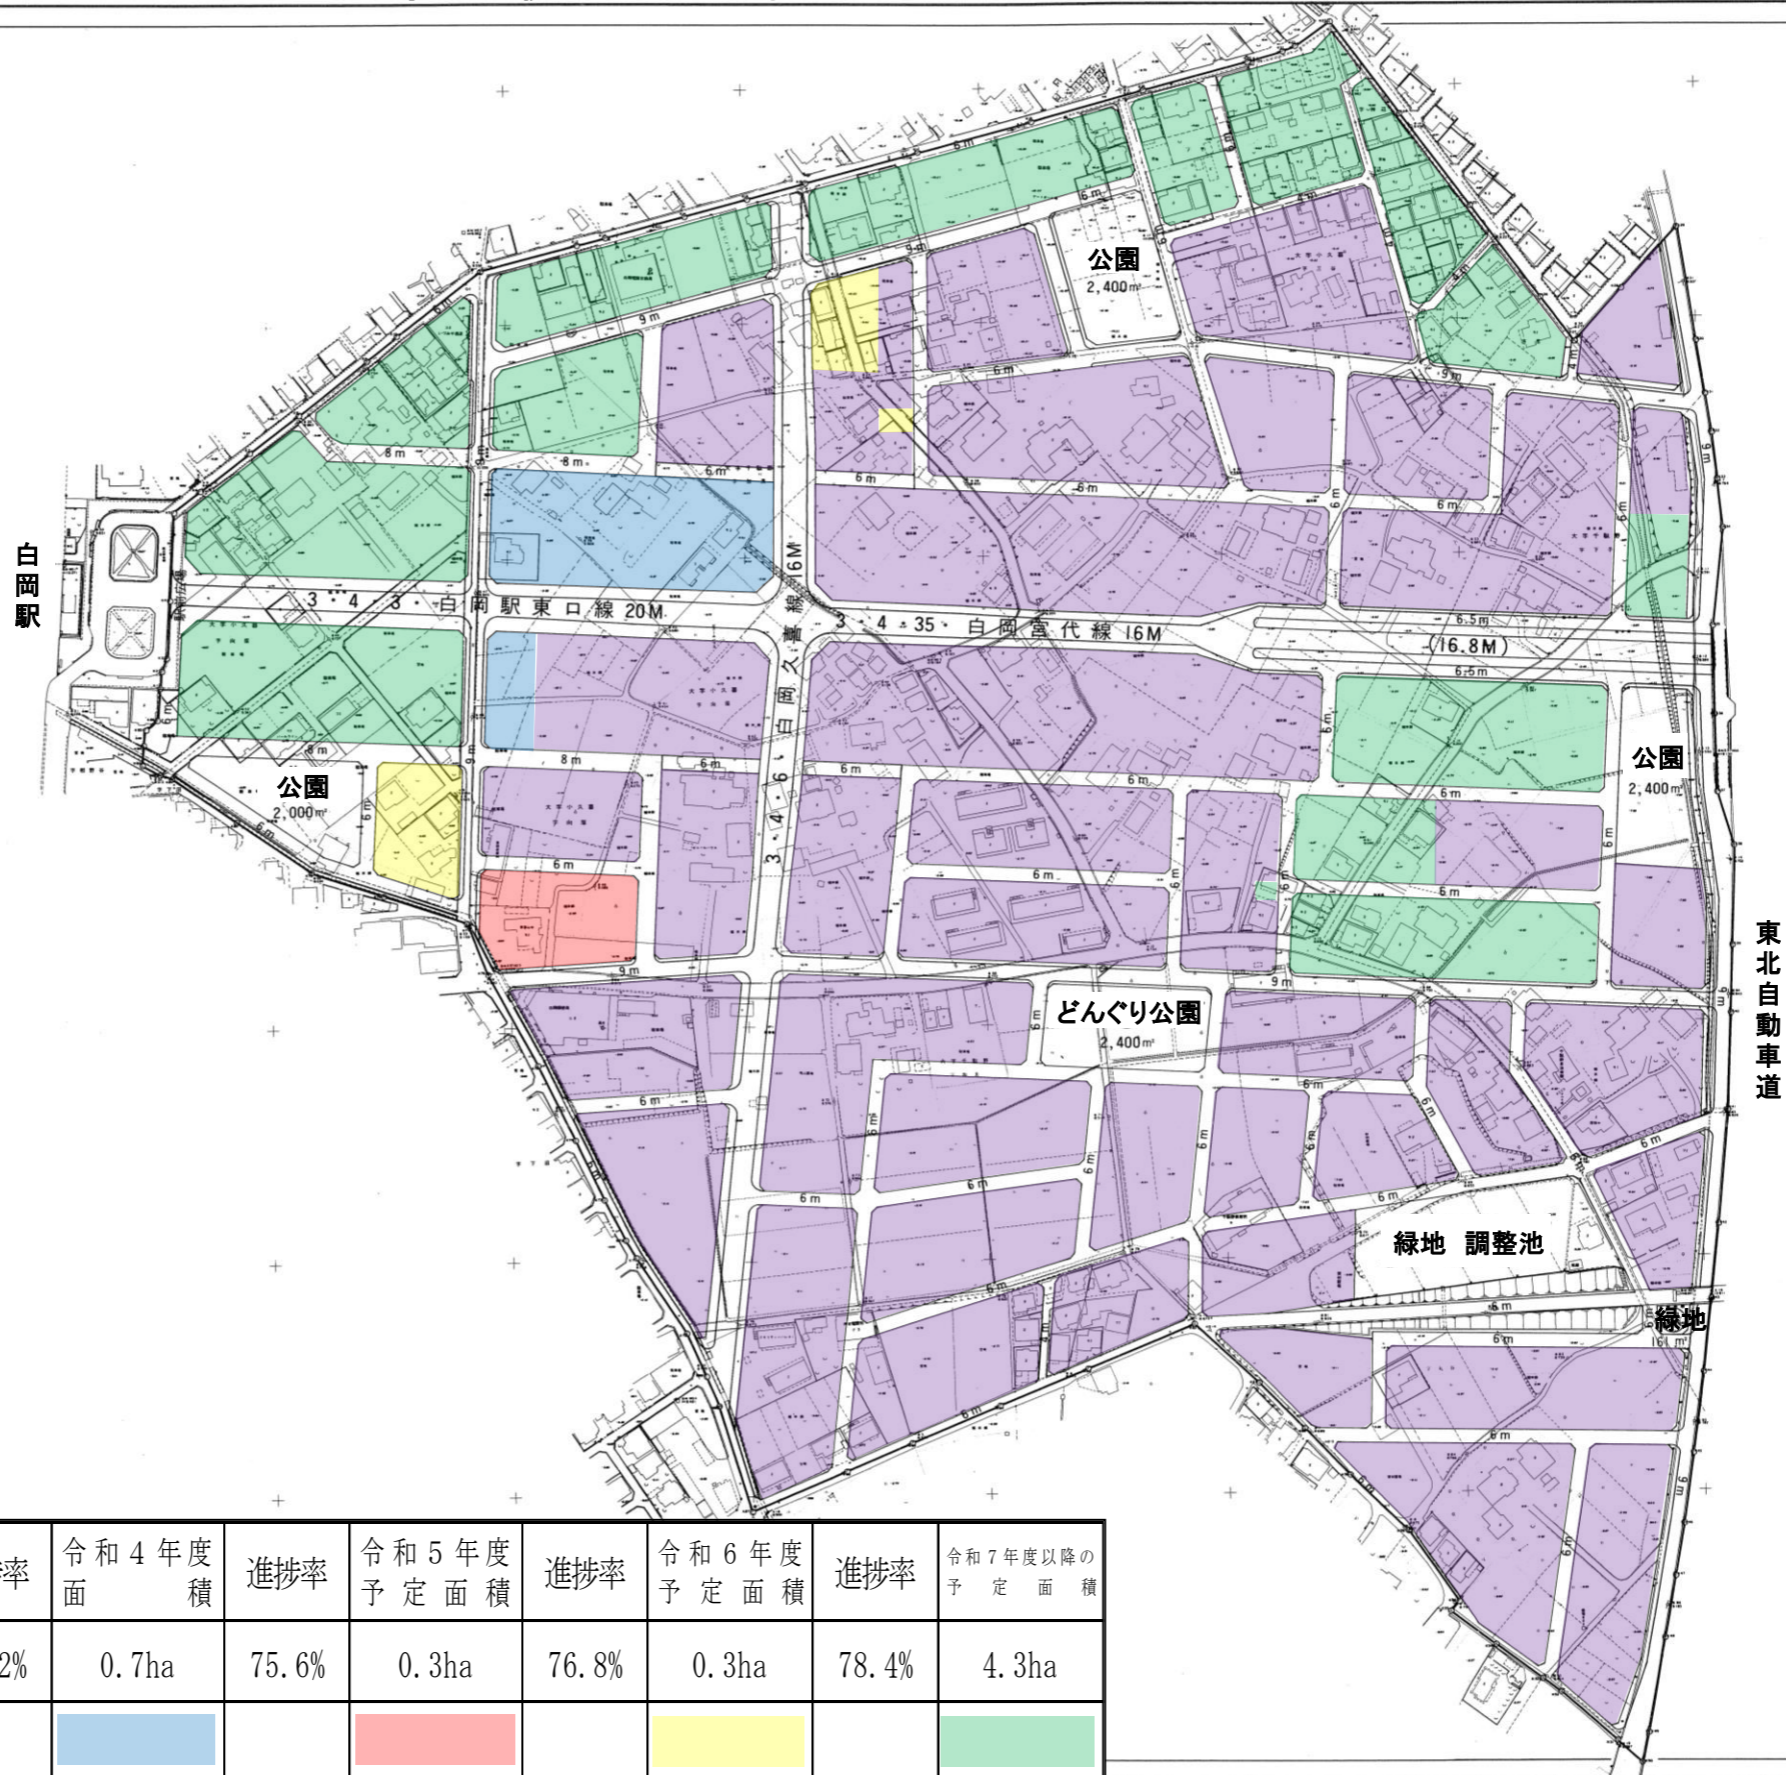

区分	事業開始年度から (平成8年度) 令和3年度までの累計面積	進捗率	令和4年度 面 積	進捗率	令和5年度 予定面積	進捗率	令和6年度 予定面積	進捗率	令和7年度以降の 予定面積
	14.7ha	72.2%	0.7ha	75.6%	0.3ha	76.8%	0.3ha	78.4%	4.3ha

※進捗率は平方メートル単位で算定しております。

白岡駅東部中央土地区画整理事務所
