

白岡駅東部中央土地区画整理事業年度別歳出等一覧表


(単位：千円)

区 分	事業開始年度から (平成8年度) 令和5年度までの累計額 A	A	令和6年度 決 算 額 B	A+B	令和7年度 決算見込額 C	A+B+C	令和8年度 当初予算額 D	A+B+C+D	令和9年度 以降の見込額 E	合 計
		F		F		F		F		F
1 市 費	4,957,785	—	216,628	—	392,106	—	302,914	—	72,991	5,942,424
(うち起債額)	( 0 )		( 0 )		( 0 )		( 0 )		( 0 )	( 0 )
2 国・県補助金	999,131	—	61,657	—	62,171	—	42,600	—	890,894	2,056,453
3 そ の 他	1,128,931	—	41,423	—	21,240	—	1,110	—	198,419	1,391,123
(分担金及び負担金)	( 659,393 )		( 0 )		( 0 )		( 0 )		( 0 )	( 659,393 )
(保留地処分金)	( 469,001 )		( 41,403 )		( 21,230 )		( 1,100 )		( 198,266 )	( 731,000 )
(諸収入)	( 537 )		( 20 )		( 10 )		( 10 )		( 153 )	( 730 )
計	7,085,847	75.5%	319,708	78.9%	475,517	83.9%	346,624	87.6%	1,162,304	9,390,000

備 考 この表は、事業計画に定める資金計画を基に作成したものであり、今後の残事業費の変更に伴い、未執行金額に増減が生じる場合があります。

# 白岡駅東部中央土地区画整理事業進捗状況図


平成十二年三月作成

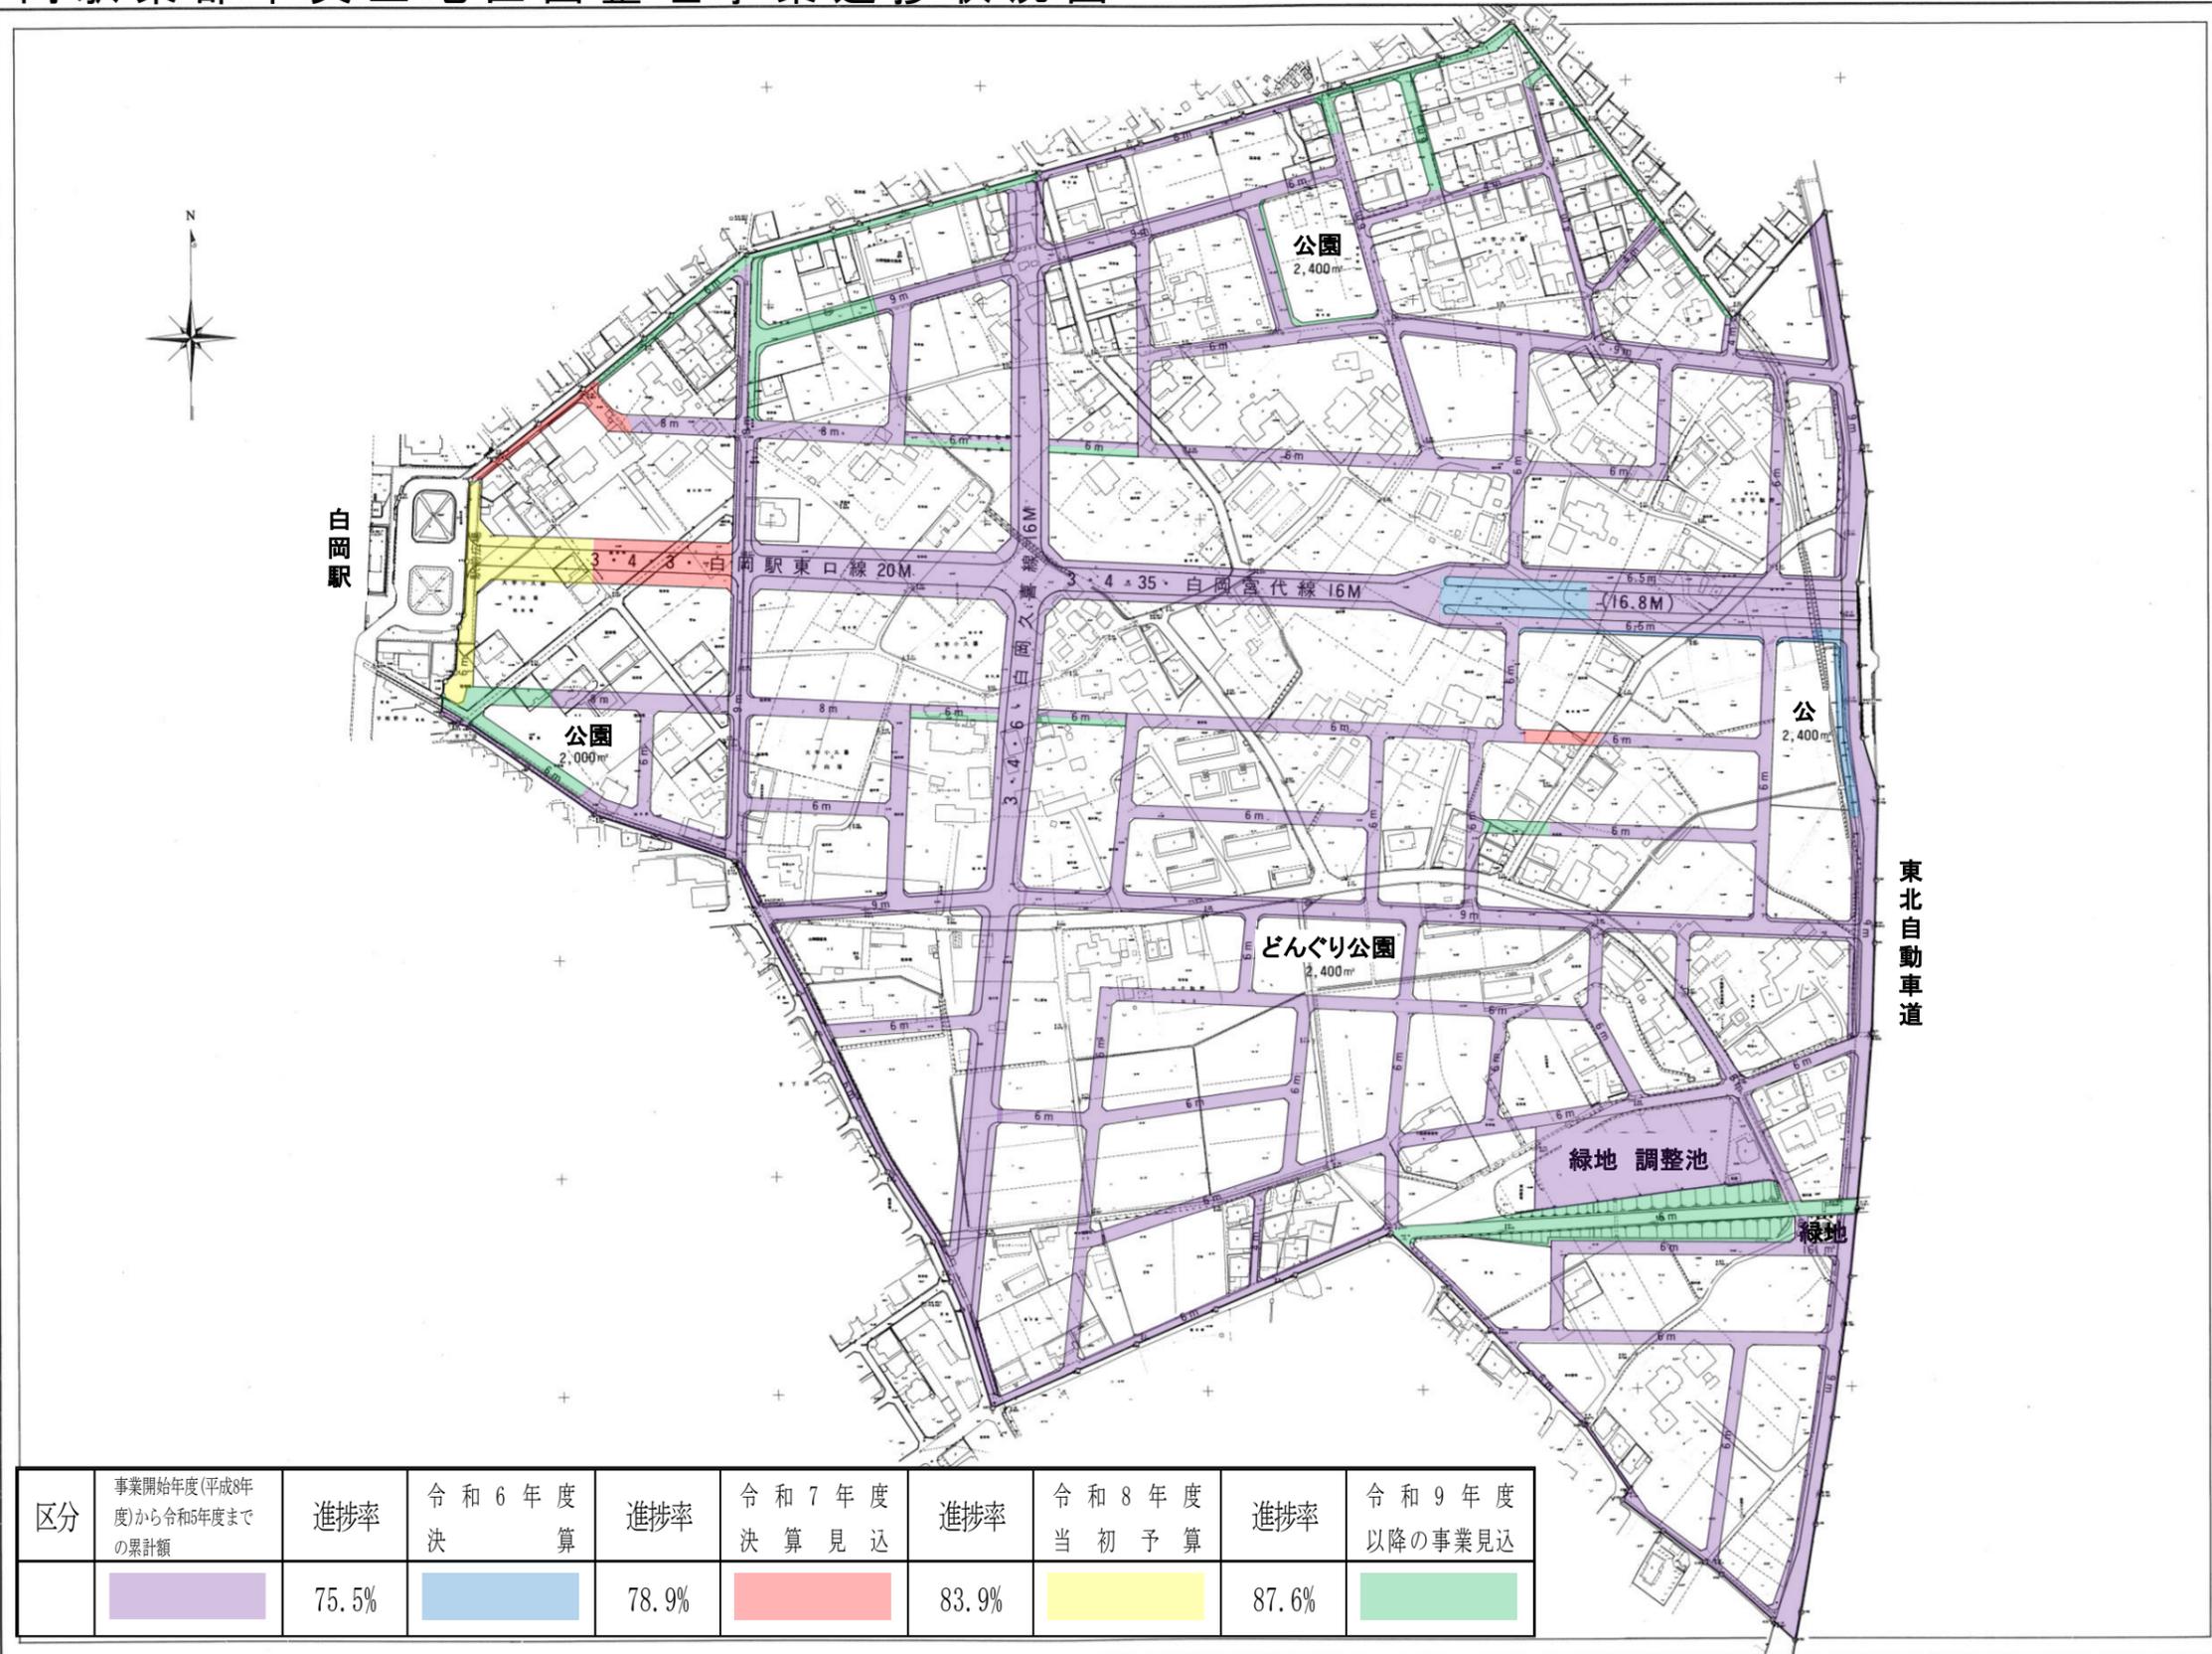


白岡駅東部中央土地区画整理事務所

# 白岡駅東部中央土地区画整理事業使用収益開始状況

平成十二年三月作成

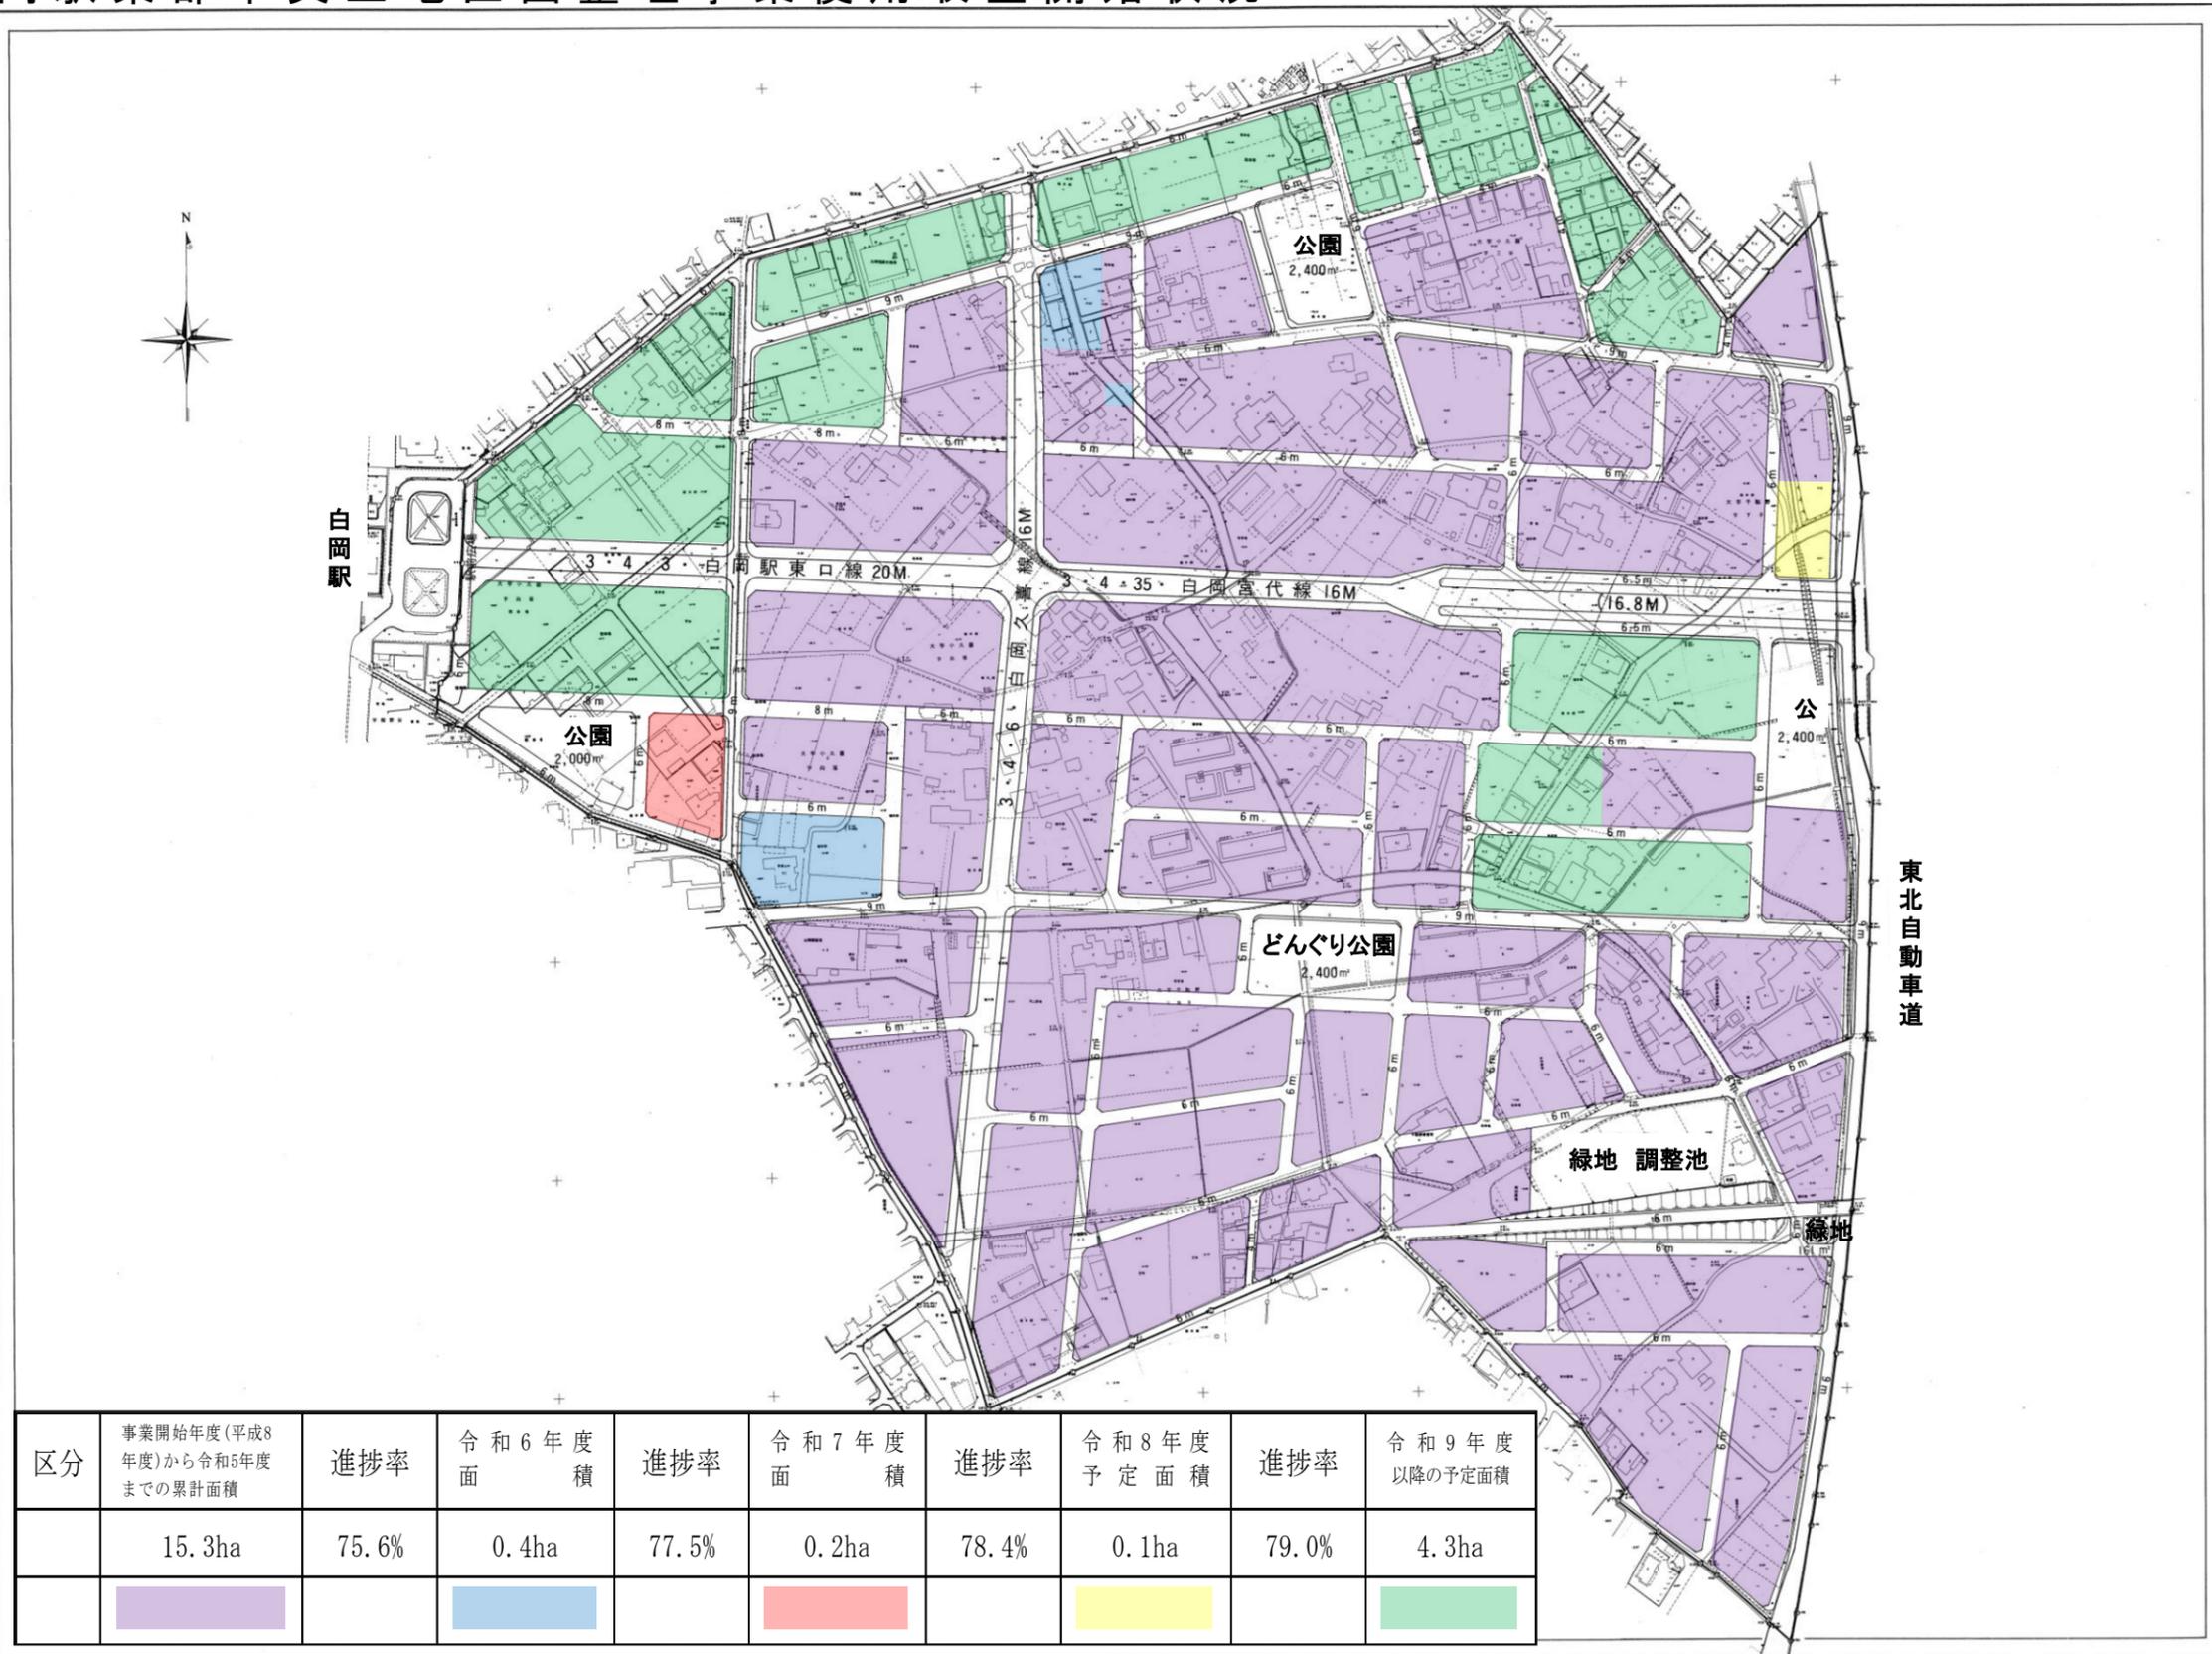

区分	事業開始年度(平成8年度)から令和5年度までの累計面積	進捗率	令和6年度積面	進捗率	令和7年度積面	進捗率	令和8年度予定面積	進捗率	令和9年度以降の予定面積
	15.3ha	75.6%	0.4ha	77.5%	0.2ha	78.4%	0.1ha	79.0%	4.3ha
									

※進捗率は平方メートル単位で算定しております。

白岡駅東部中央土地区画整理事務所
