

白岡駅東部中央土地区画整理事業年度別歳出等一覧表


(単位：千円)

区 分	事業開始年度から (平成8年度) 令和2年度までの累計額 A	A	令和3年度 決 算 額 B	A+B	令和4年度 決 算 額 C	A+B+C	令和5年度 当初予算額 D	A+B+C+D	令 和 6 年 度 以降の見込額 E	合 計
		F		F		F		F		F
1 市 費	4,467,639	—	137,600	—	176,507	—	239,839	—	1,398,293	6,419,878
(うち起債額)	(0)		(0)		(0)		(0)		(0)	(0)
2 国・県補助金	767,368	—	63,159	—	89,393	—	42,775	—	804,164	1,766,859
3 そ の 他	1,105,084	—	15	—	559	—	4,807	—	302,798	1,413,263
(分担金及び負担金)	(641,000)		(0)		(543)		(0)		(17,990)	(659,533)
(保留地処分金)	(463,601)		(0)		(0)		(4,797)		(284,602)	(753,000)
(諸 収 入)	(483)		(15)		(16)		(10)		(206)	(730)
計	6,340,091	66.0%	200,774	68.1%	266,459	70.9%	287,421	73.9%	2,505,255	9,600,000

備 考 この表は、事業計画に定める資金計画を基に作成したものであり、今後の残事業費の変更に伴い、未執行金額に増減が生じる場合があります。

白岡駅東部中央土地区画整理事業進捗状況図

平成十二年三月作成

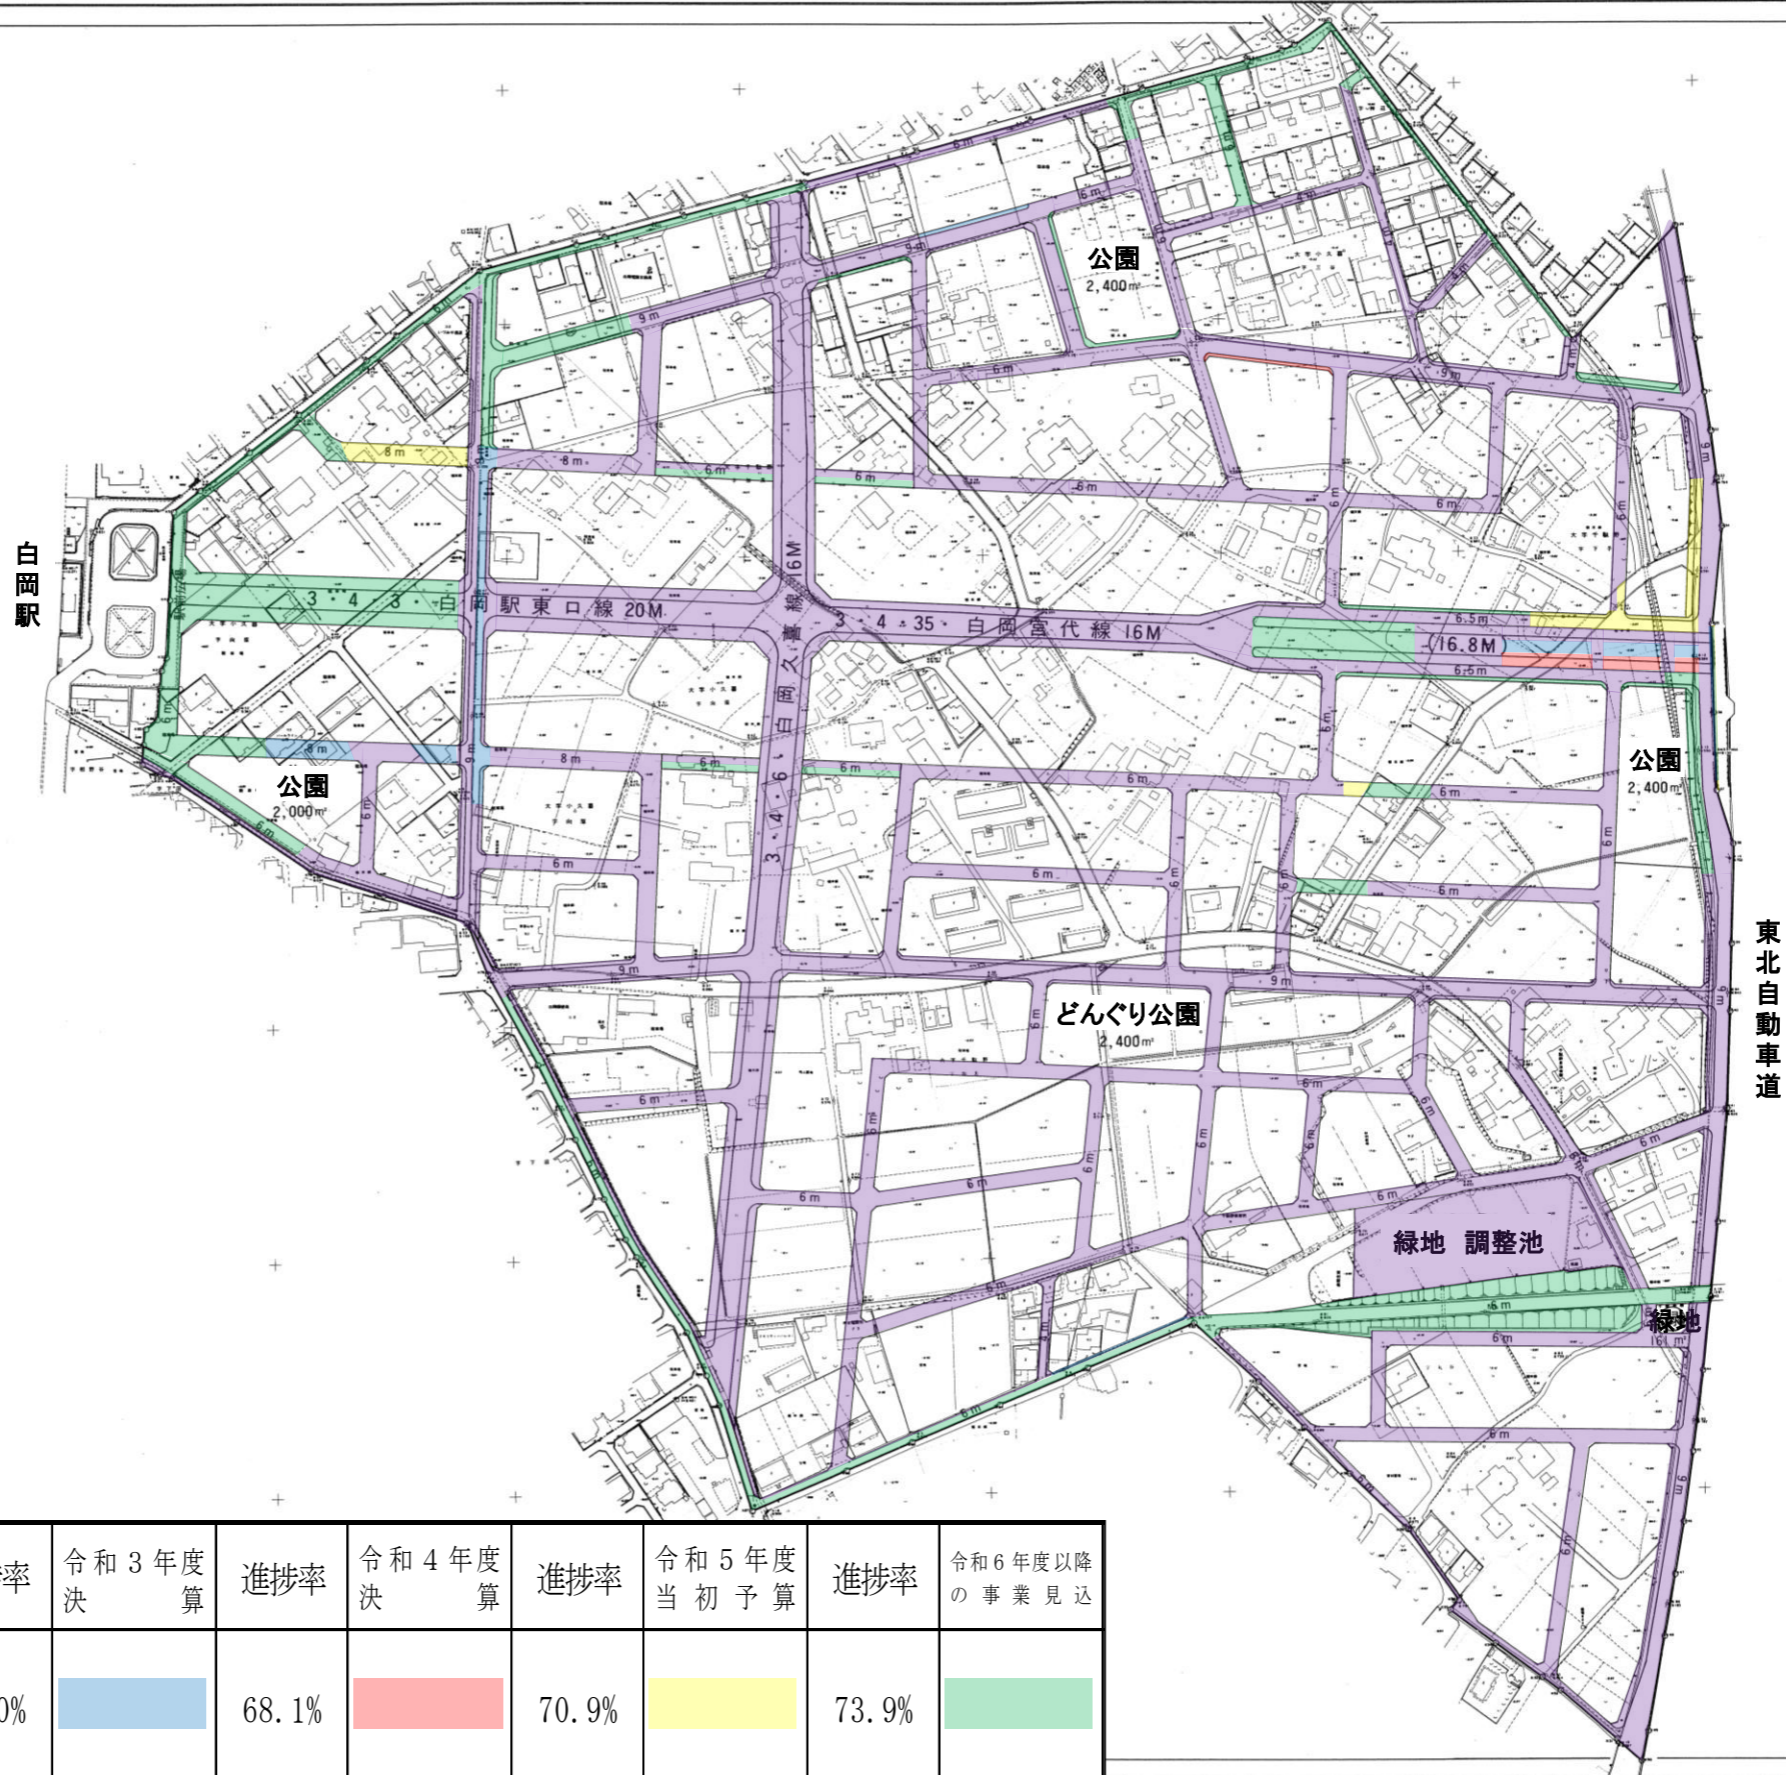


区分	事業開始年度から (平成8年度) 令和2年度までの累計	進捗率	令和3年度 決算	進捗率	令和4年度 決算	進捗率	令和5年度 当初予算	進捗率	令和6年度以降 の事業見込
		66.0%		68.1%		70.9%		73.9%	

白岡駅東部中央土地区画整理事務所

白岡駅東部中央土地区画整理事業使用収益開始状況図

平成十二年三月作成

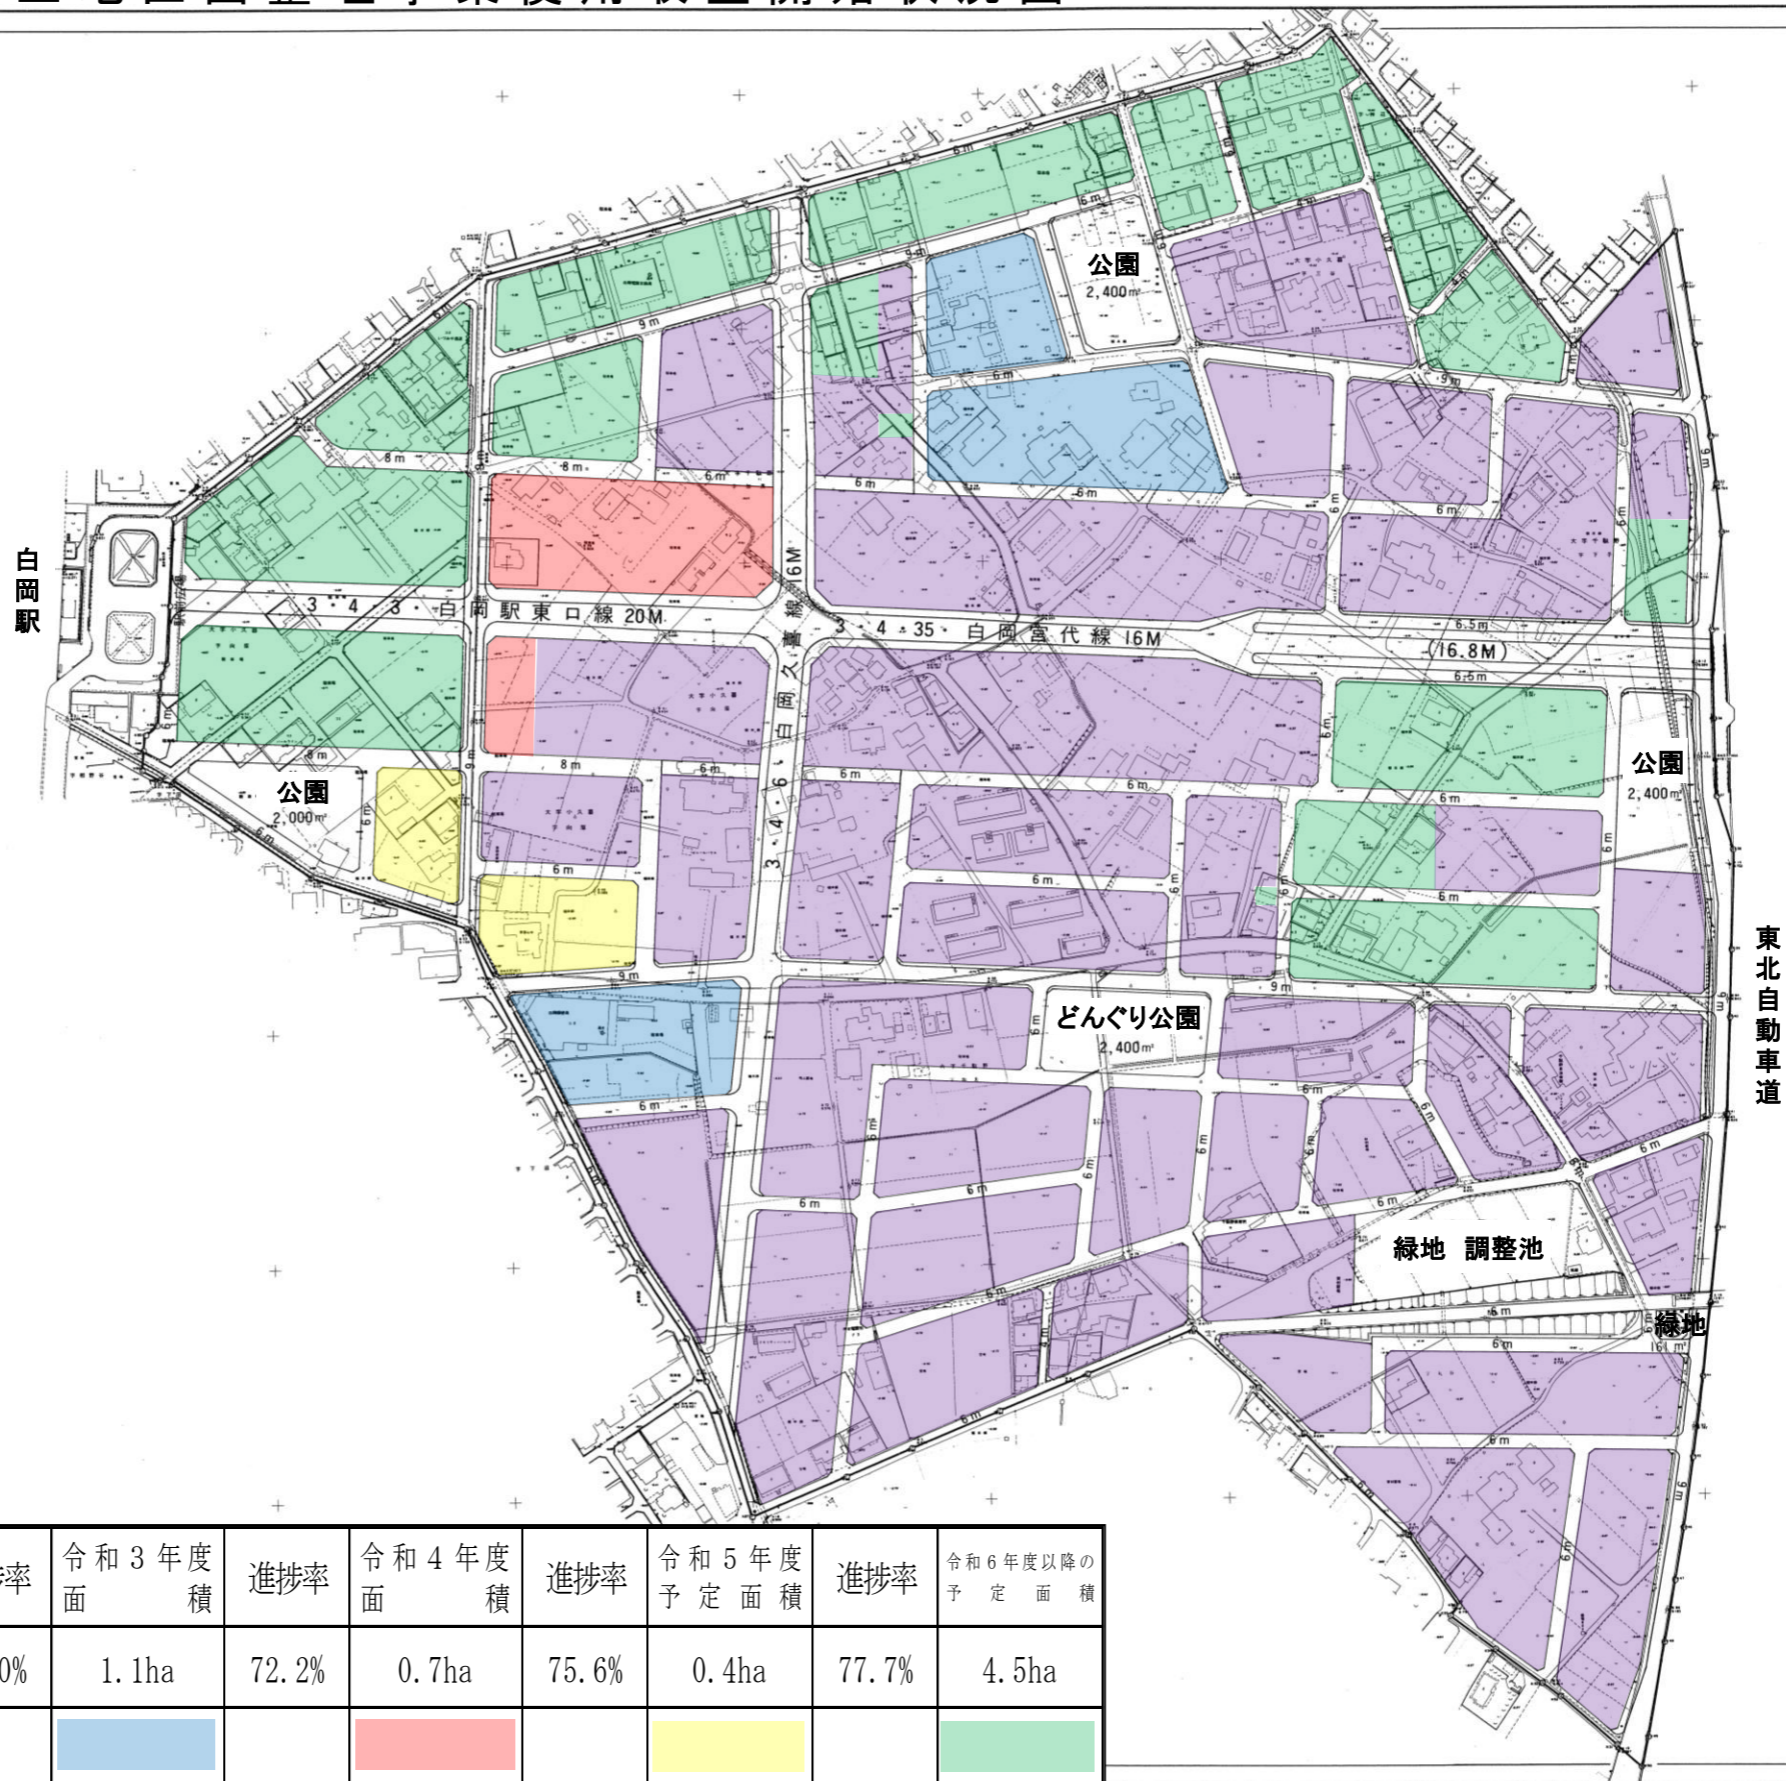

区分	事業開始年度から (平成8年度) 令和2年度までの累計面積	進捗率	令和3年度 面積	進捗率	令和4年度 面積	進捗率	令和5年度 予定面積	進捗率	令和6年度以降の 予定面積
	13.6ha	67.0%	1.1ha	72.2%	0.7ha	75.6%	0.4ha	77.7%	4.5ha

※進捗率は平方メートル単位で算定しております。

白岡駅東部中央土地区画整理事務所
