

白岡駅東部中央土地区画整理事業年度別歳出等一覧表


(単位：千円)

区 分	事業開始年度から (平成8年度) 令和4年度までの累計額 A	A	令和5年度 決 算 額 B	A+B	令和6年度 決算見込額 C	A+B+C	令和7年度 当初予算額 D	A+B+C+D	令和8年度 以降の見込額 E	合 計
		F		F		F		F		F
1 市 費	4,781,746	—	176,039	—	307,218	—	271,336	—	406,085	5,942,424
(うち起債額)	(0)		(0)		(0)		(0)		(0)	(0)
2 国・県補助金	919,920	—	79,211	—	98,595	—	77,550	—	881,177	2,056,453
3 その他	1,105,658	—	23,273	—	41,413	—	17,380	—	203,399	1,391,123
(分担金及び負担金)	(641,543)		(17,850)		(0)		(0)		(0)	(659,393)
(保留地処分金)	(463,601)		(5,400)		(41,403)		(17,370)		(203,226)	(731,000)
(諸収入)	(514)		(23)		(10)		(10)		(173)	(730)
計	6,807,324	72.5%	278,523	75.5%	447,226	80.2%	366,266	84.1%	1,490,661	9,390,000

備 考 この表は、事業計画に定める資金計画を基に作成したものであり、今後の残事業費の変更に伴い、未執行金額に増減が生じる場合があります。

白岡駅東部中央土地区画整理事業進捗状況図

平成十二年三月作成

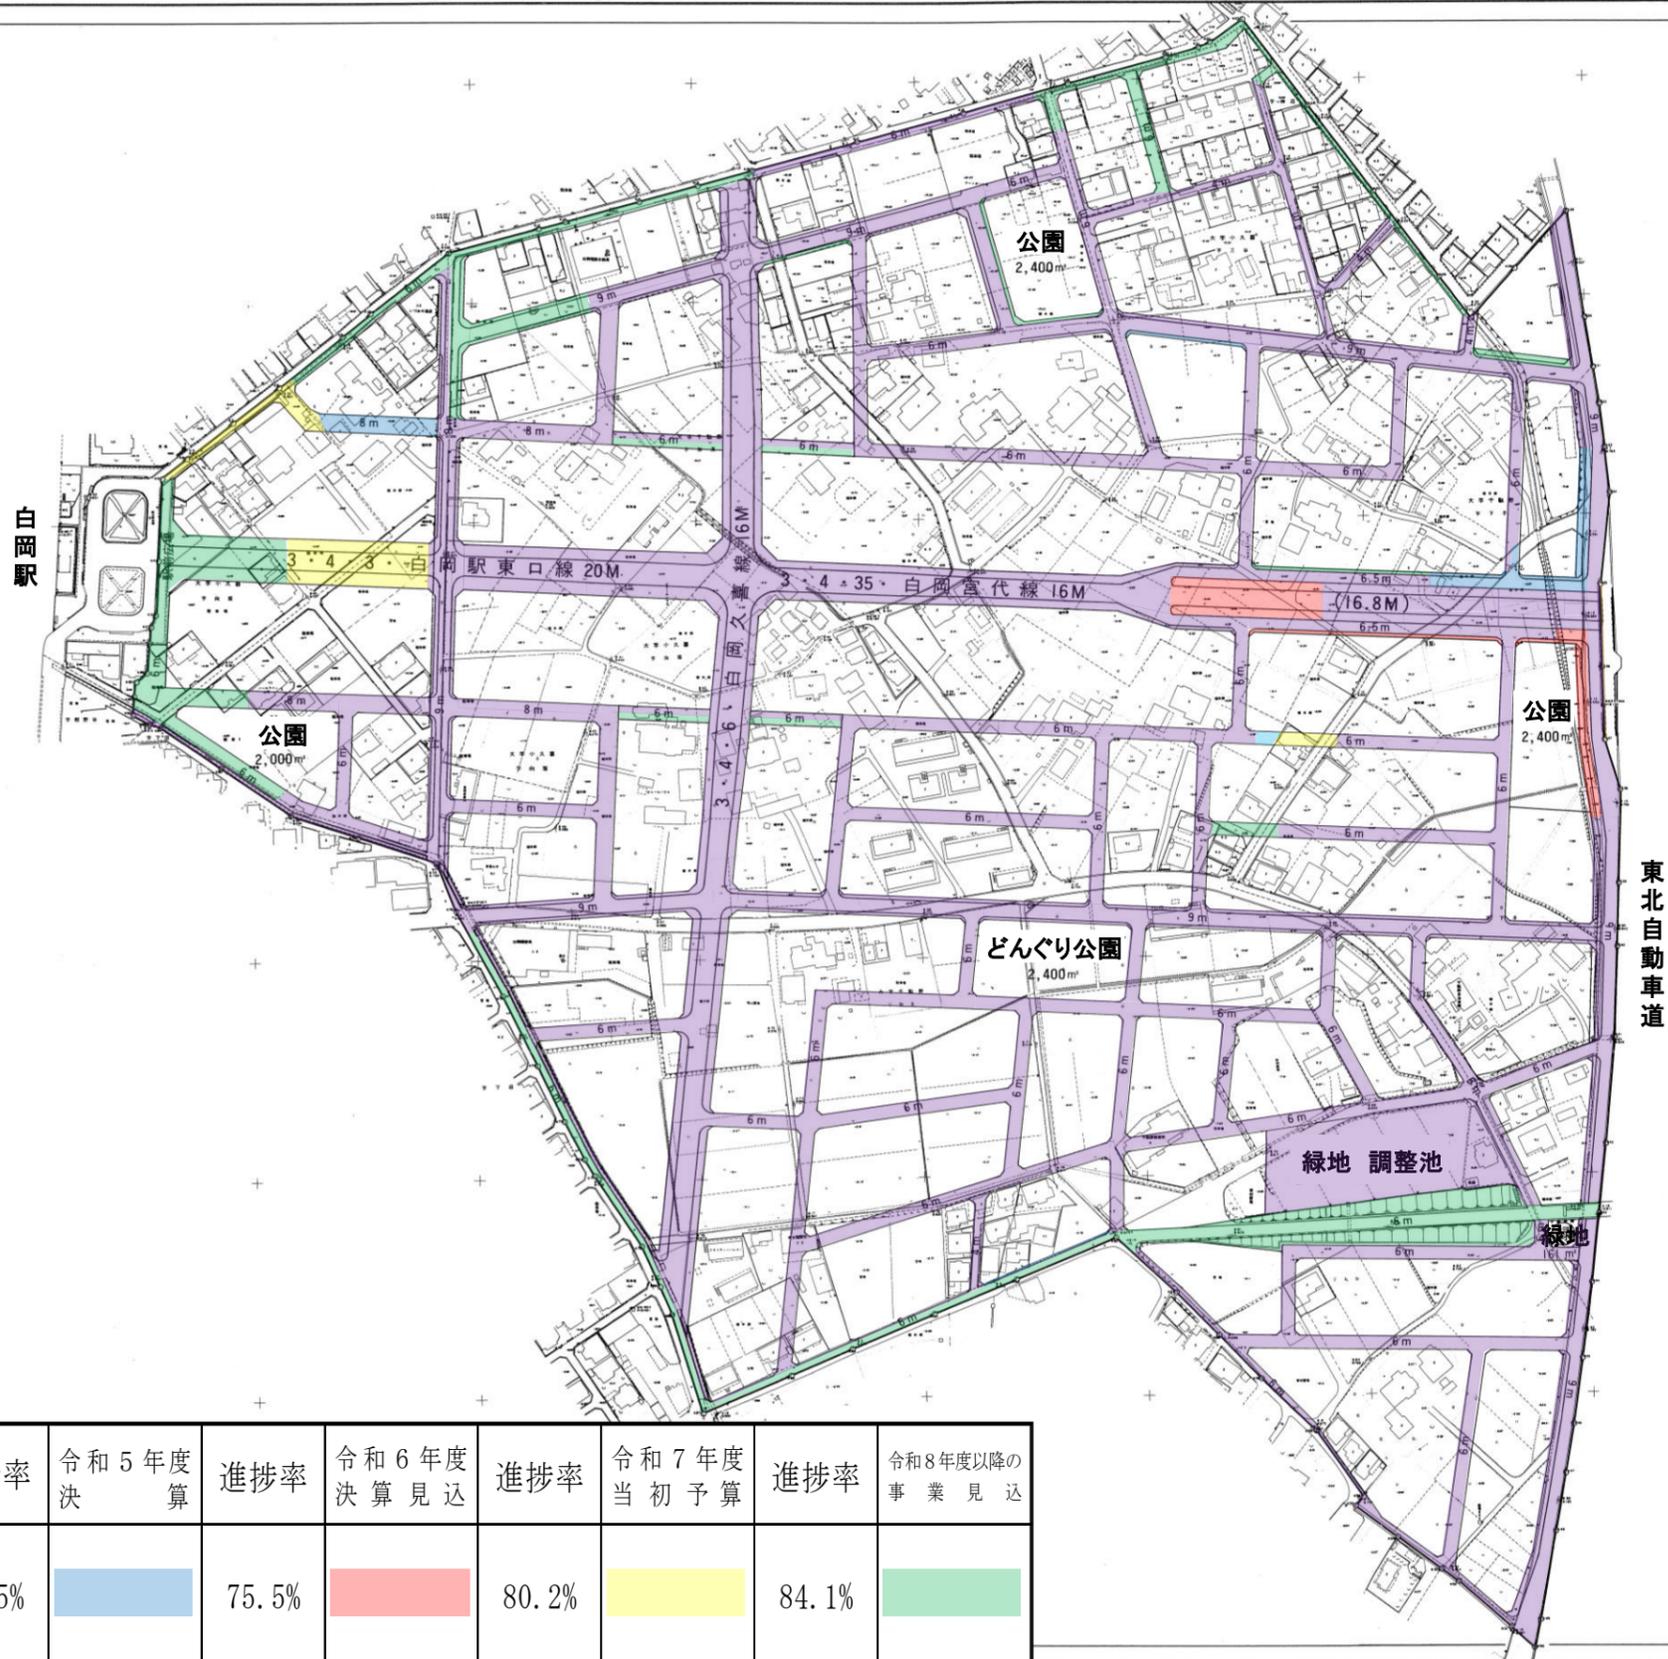


区分	事業開始年度から (平成年度) 令和4年度までの累計	進捗率	令和5年度 決算	進捗率	令和6年度 決算見込	進捗率	令和7年度 当初予算	進捗率	令和8年度以降の 事業見込
		72.5%		75.5%		80.2%		84.1%	

白岡駅東部中央土地区画整理事務所

白岡駅東部中央土地区画整理事業使用収益開始状況図

平成十二年三月作成

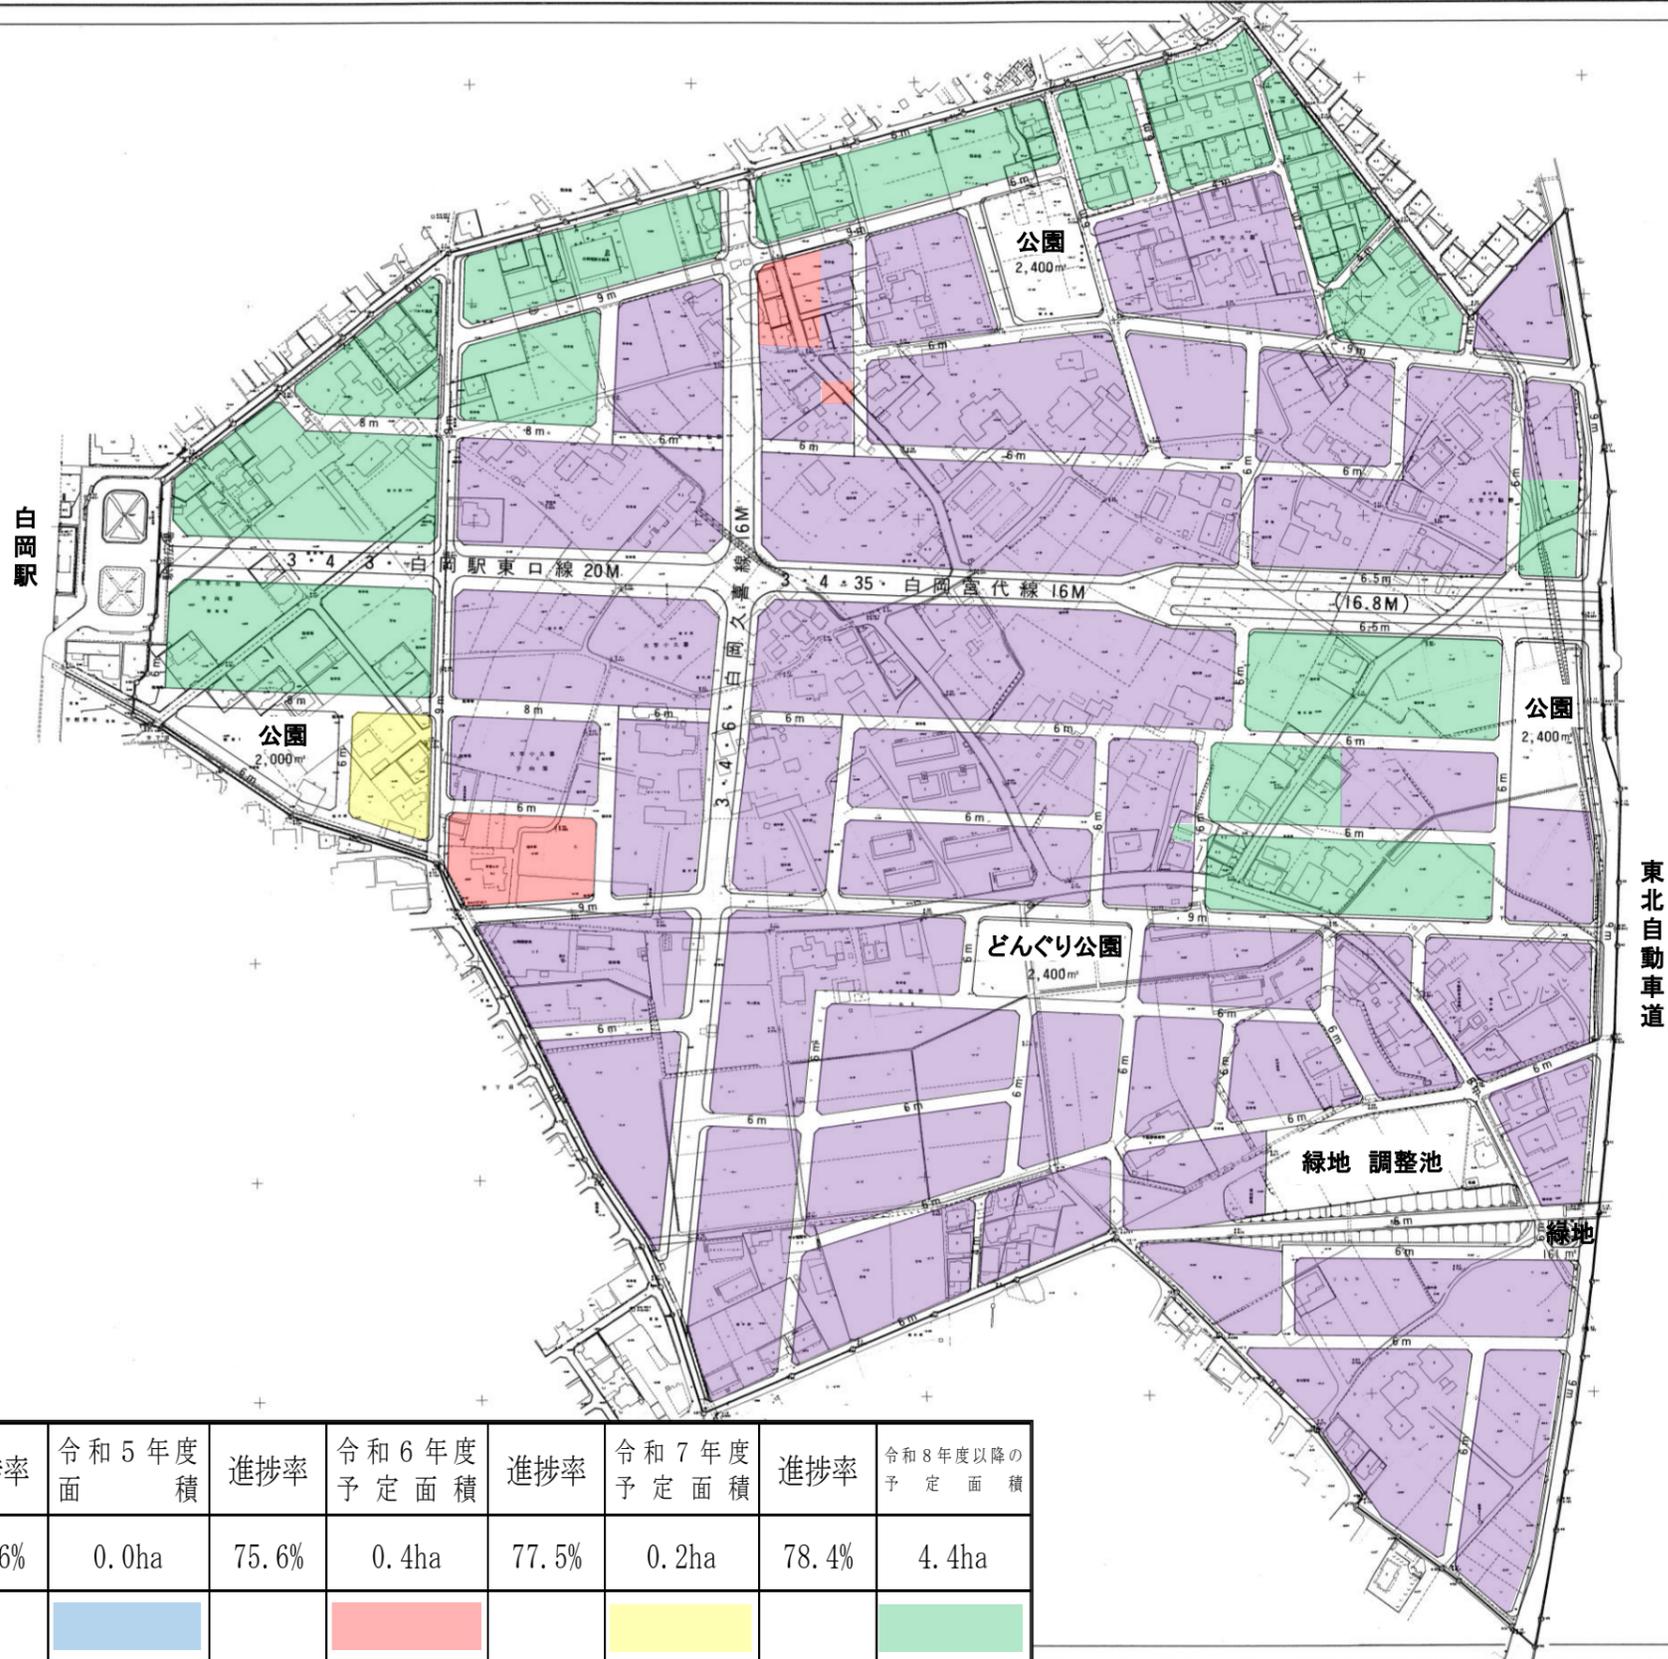

区分	事業開始年度から (平成8年度) 令和4年度までの累計面積	進捗率	令和5年度 面 積	進捗率	令和6年度 予定面積	進捗率	令和7年度 予定面積	進捗率	令和8年度以降の 予定面積
	15.3ha	75.6%	0.0ha	75.6%	0.4ha	77.5%	0.2ha	78.4%	4.4ha

※進捗率は平方メートル単位で算定しております。

白岡駅東部中央土地区画整理事務所
