議案第８０号

西小学校新校舎新築工事請負契約の変更契約の締結について

次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて議決を求める。

１　工　事　名　　西小学校新校舎新築工事

２　施 工 箇 所　　白岡市立西小学校地内（白岡市西６丁目３番１の一部）

３　履 行 期 限　　令和９年１月２９日

４　変更履行期限　　令和９年３月１５日

５　変更請負金額　　２９４，４０９，５００円

（２，９５９，０００円増）

（うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ２６，７６４，５００円）

６　請 負 業 者　　埼玉県上尾市原市中１丁目７番地８

千代本興業株式会社

代表取締役　千代　達也

令和８年１１月２６日提出

白岡市長　藤井　栄一郎

提　案　理　由

西小学校新校舎新築工事請負契約の変更契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、この案を提出するものである。

西小学校新校舎新築工事請負契約の変更理由

（変更理由）


本工事の施工に伴う掘削等により、地中埋設コンクリート及び当初設計と異なる既設電気配線の状況が判明し、コンクリートの撤去及び電気配線の移設等が必要となった。また、現地確認により不要となった北門門扉の一時撤去・復旧及び既設給水管の改修工事を取りやめるため、工事内容及び請負金額を変更するものである。

併せて、地中埋設物への対応等に伴い工程を見直した結果、当初の履行期限内での工事完了が困難となったため、履行期限を令和９年３月１５日まで延長するものである。

（参考）

白岡市立西小学校（白岡市西６丁目３番１の一部）



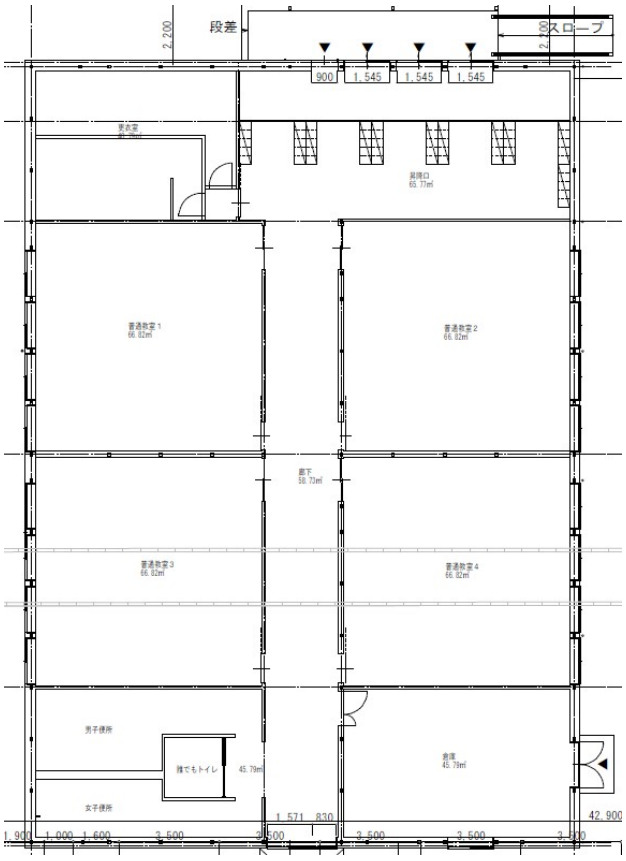

建物概要

１棟　鉄骨造　１階建て　建築面積　５３４．４５㎡

延べ面積　５１９．９８㎡
